




**РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
**ТАДЖИКИСТАНА**  
**(НСИФТ)**

**CASA-1000 ПРОЕКТ ПОДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ (ППС)**

**По подпроекту: CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле  
Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары».**

**«ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ»  
(ПУОСС)**

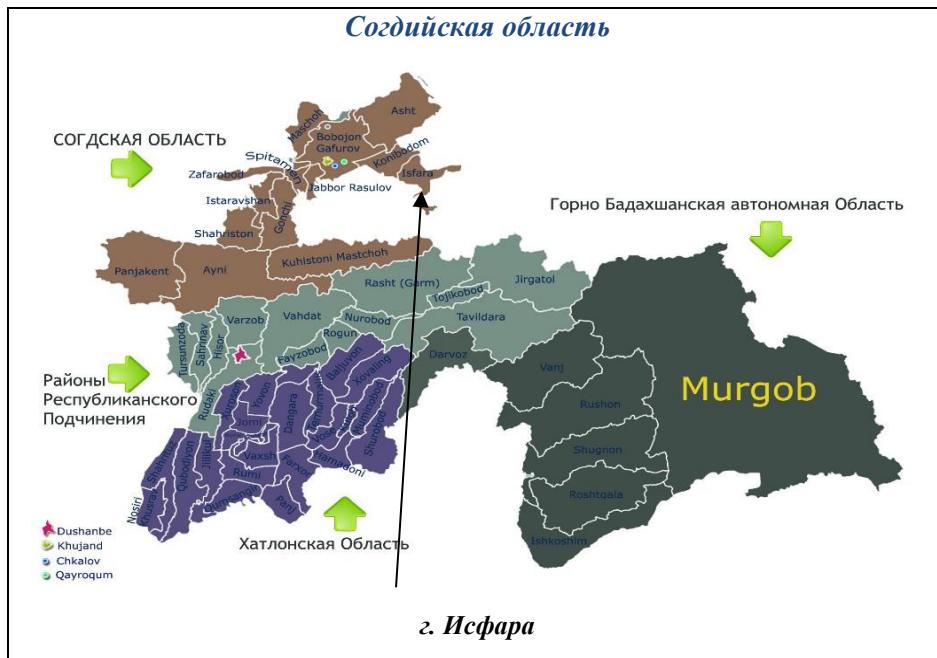

Душанбе, 2022 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Цель подпроекта.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Исходные Данные</b>	<b>6</b>
<b>ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ .....</b>	<b>7</b>
<b>ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗПАСНОСТИ .....</b>	<b>18</b>
<b>ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ .....</b>	<b>19</b>
<b>ЧАСТЬ Д: ПЛАН ПО МОНИТОРИНГУ .....</b>	<b>35</b>
<b>Приложения:</b>	
<b>1. Подтверждающий документ – Решения председателя города.....</b>	<b>44</b>
<b>2. Письмо зав.ГОРОНО.....</b>	<b>45</b>
<b>3. Министерства образования .....</b>	<b>46</b>
<b>4. Контрольный перечень предварительной социальной проверки .....</b>	<b>47</b>
<b>5. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды .....</b>	<b>49</b>
<b>6. Сертификат землепользователя</b>	<b>50</b>
<b>7. Протокол публичных консультаций</b>	<b>52</b>
<b>8. Фото публичных консультаций</b>	<b>54</b>
<b>9. Список публичных консультаций</b>	<b>55</b>
<b>10.Кодекс этики и служебного поведения работников (ОБРАЗЕЦ)</b>	<b>56</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CASA1000	Проект по передаче и торговле электроэнергией в Центральной Азии и Южной Азии
АСМ	Асбестосодержащий материал
БТ	ОАХК «Барки Точик»
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГН	Гендерное Насилие
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
ИСУ	Информационная система управления
КООС	Комитет по охране окружающей среды
КРС	Консультант по развитию сообществ
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МАР	Международная ассоциация развития
МДТФ	Многосторонний донорский целевой фонд
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
МОС	Механизм обратной связи
МРЖ	Механизм рассмотрения жалоб
МФ	Министерство финансов Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
ОПП	Основы политики переселения
ОРП	Операционное руководство проекта
ОФГ	Обсуждение в Фокус группе
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ПДП	План действий по переселению
ПКД	Проектные комиссии джамоатов
ПКС	Проектный комитет села
ПОС	Партнер по проведению обучения и оказанию содействия
ППС	CASA-1000 Проект поддержки сообщества
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой
РДООССВ	Рамочный документ по охране окружающей среды и социальным вопросам
РИС	Развитие по инициативе сообществ
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
ЦУП	Центр управления проектом НСИФТ
ЦУПЭС	Центр управления проектами по энергетическим секторам
ЭКО	Экологическая и социальная оценка
ЭСС	Экологические и социальные стандарты

## 1. Введение

Республика Таджикистан получила грант в размере 26 миллионов долларов США от Всемирного банка на покрытие расходов по проекту «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» для Таджикистана, который реализуется Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана (НСИФТ) и Государственным учреждением «Центром по управлению проектами в энергетическом секторе» (ЦУПЭС).

**Цель CASA-1000 Проект поддержки сообществ (ППС) в Таджикистане** состоит в том, чтобы повысить качество и доступ к энергетическим, социальным и экономическим инфраструктурным услугам, а также внести вклад в укрепление местного управления в сообществах на территории проекта.



ППС будет внедряться в 65 селах вдоль Коридора воздействия CASA-1000 в Таджикистане определяемого как 1,5 км по обе стороны от Линии электропередачи (ЛЭП) CASA-1000, то есть от Согдийской области на севере до Хатлонской области на юге и охватывает 13 городов и районов, 24 джамоатов, в том числе городов Турсунзода, Гиссар, Левакант и районов Спитамен, Шахринав, Рудаки, Хурносон, Абдурахмони Джоми, Вахш, Кушониён, Джалолиддини Балхи, Джайхун.

Кроме того, ППС окажет поддержку целевым приграничным джамоатам в городе Исфара Согдийской области, охватываемый 50 махаллей объединённые в 11 групп в джамоатах Ворух и Чоркух города Исфара.

«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) состоит из четырех взаимосвязанных компонентов.

**Компонент 2** проекта направлен на финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребности сёл коридора воздействия (КВ) и приграничных сёл джамоата Ворух и Чоркух города

Исфары (ПР) с участием самих жителей и процесса принятия решений на основе широкого участия населения, то есть методом РИС (Развития по инициативе сообществ).

*Исполнительным агентством второго, третьего и четвёртого компонентов «CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) является Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ).*

## **2. Цель подпроекта**

Цель реализации подпроекта CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары».

В связи с этим, отбор подпроекта CSP-2B-33 для реализации было со стороны самих жителей махаллы Ходжай аъло, на основе проведённых исследований в Фокус группах 04-09 июня 2021 года и как первостепенным приоритетом на общем собрании села, в котором также принимали решения пожелые, инвалиды, женщины, предприниматели и молодёжь. Необходимо отметить, что строительство детского сада в селе Ходжай аъло, является интересами женщин, так как воспитание детей в основном возложено на женщин.

Разработки «Плана управления окружающей и социальной средой» (ПУОСС) в рамках реализации подпроекта CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары» заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате строительства нового детского сада.

Разработанный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанного подпроекта CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары» с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным Всемирным Банком экологическим и социальным требованиям ОП 4.01 «Экологическая оценка», а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого плана заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчика выполняемых строительных работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для отбора подрядной организации в рамках подпроектов, финансируемых Всемирным Банком «CASA-1000 Проект поддержки сообществ».

### **3. Исходные данные**



*Фото участка выбранного для реализации подпроекта CSP-2B-33*

Территория, которое было выбрано для реализации подпроекта CSP-2B-33, находится в махалле Ходжай аъло на свободном участке средней школы №24. Рельеф выбранного участка ровный, по близости никаких спец. объектов не находятся. Ранее на данном участке потоплении и эрозии земли не наблюдалось, на фотографиях показаны виды типичного рельефа и ландшафт этого участка. В 15 метрах от участка строительства находится здание спортзала школы №24, в 1,5 метрах-земельный участок (огород, сад) и более 15-и метрах жилые дома местных сообществ. Непосредственно на участке строительства находятся 4 штуки плодовых дерева.

Данный участок, где будет проводиться реализация проекта, не оказывает воздействие на транспортную и коммунальную инфраструктуру. В целом, геология территории подходит для строительства нового детского сада. После прохождения ПСД экологической и Государственной экспертизы по строительству детского сада в селе Ходжай аъло, начнутся процедуры по проведению тендера для отбора Подрядной организации. ПУОСС будет добавлен в тендерную документацию.

*Более подробная информация относительно данного раздела изложена в Части С: Меры по смягчению рисков.*

## ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1А. Институциональные и административные данные.			
Страна	Таджикистан		
Название Проекта	CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары».		
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ).		
Охват проекта и проектной деятельности	<p>«CASA-1000 Проект поддержки сообществ» (ППС) охватывает сёла расположенные вдоль Коридора воздействия CASA-1000.</p> <p>Проект охватывает население махаллы Ходжай аъло и территорию школы данного села.</p>		
Сфера деятельности участка/объекта	<p>Подпроект CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары».</p> <p>В рамках реализации подпроекта CSP-2B-33 предусмотрено строительства одноэтажного детского сада в махалле Ходжай аъло которое включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ограждение территории проведения работ,</li> <li>• обустроить места для приёма пищи, отдыха и для общих санитарно-гигиенических нужд (раздевалка, туалет, душевая).</li> <li>• подготовка площадок для складирования стройматериалов.</li> <li>• строительства нового здания.</li> <li>• монтаж дверных и оконных проемов.</li> <li>• отделочные работы.</li> <li>• монтажные работы по прокладке кабеля и труб.</li> <li>• площадка для сбора строительного мусора и не поврежденных материалов.</li> <li>• Вывоз мусора и благоустройство территории.</li> </ul>		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	Zаказчик НСИФТ: Координатор ППС: Нажмиддинов М. Maruf-a-n@mail.ru	Надзор за экологическими и социальными рисками (НСИФТ)  Главный специалист по экологическими социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе: Насирджанов Фарход Эл. почта: <a href="mailto:nfarik1611@gmail.com">nfarik1611@gmail.com</a> Моб. тел: +992-985-98-85-88	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)		Подрядчик: (подлежит к определению)	Государственный надзор

## 2А. Описание строительного участка

Название участка (подпроект)	CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары».
Описание местоположения объекта, включая приложение с картой объекта	<p>Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, город Исфара, джамоат Чоркух, махалла Ходжай аъло на территории среднего общеобразовательного учреждения №24.</p>  <p><i>Карта участка подпроекта CSP-2B-33(красный свет)</i></p> <p>Новый детский сад будет находиться на севере от основного здания, северо-восточной части села Ходжай аъло (координаты его расположения 39°94'09"N 70°49'28"E).      Новый детский сад, расположен на свободном участке средней школы №24. Рядом с предполагаемым объектом находится данная школа. Расстояние от границы строительного участка; В 15 метрах от участка строительства находится здание спортзала школы №24, в 1,5 метрах-земельный участок (огород, сад) и более 15-и метрах жилые дома местных сообществ. Непосредственно на участке строительства находятся 4 штуки плодовых дерева.</p>
Анализ альтернатив	Относительно отбора место для строительства детского сада, из-за отсутствия свободных участков альтернативное расположение не рассматривался. Изначально было принято решение построить детский сад, на территории прилегающий к СШ, что так же является удобным для населения сообщества.

	<p>Были рассмотрены три варианта действия:</p> <p><u>Первый вариант</u> Учитывая то, что проблема в данном селе была нехватка детского сада, данный вариант стал неприемлемым для реализации.</p> <p><u>Второй вариант</u> строительство нового детского сада на территории СШ. Данный вариант является оптимальным решением, так как после реализации проекта в школе данного села прибавиться детский сад мощностью для более 32 мест, что является одной из целей Проекта поддержки сообществ.</p> <p><u>Третий вариант бездействие.</u> Необходимо отметить, что отсутствие детского сада класса может привести к негативным последствиям, связанным со здоровьем детей и недовольством населения, что идёт в разрез с целями Проекта поддержки сообществ.</p> <p>В заключение можно с уверенностью сказать, что реализация подпроекта CSP-2B-33, даёт возможность увеличить число и уровень знаний детей, а также рабочих мест для жителей данного села.</p>
Кому принадлежит земля?	Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа. Землепользователем на момент реализации проекта является министерство образования.
Кто использует землю (формально / неформально)?	Используемая земля под строительство дополнительного учебного корпуса имеет Сертификат землепользователя всего на 3,30 га, выданное со стороны Государственный орган по управлению земельными ресурсами Республики Таджикистан на основании решения председателя г. Исфара от 20.09.2010 года №443 (Степень А №0291655). Участок земли 1; для СШ№24
Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического, социально-экономического характера	<p><u>Географическое описание:</u> Средняя школа №24 находится в северо-восточной махалли Ходжай аъло, которая расположена в севере города Исфары, Согдийской области, 243 км к северу от города Душанбе.</p> <p>Население махалли Ходжай аъло 5147 человек, что в совокупности составляет 558 хозяйств.</p> <p>Погода в городе Исфары под влиянием Среднеширотный сухой засушливый (пустынный) климата. Испарение в среднем превышает количество осадков, но менее половины потенциального</p>

испарения. Средняя температура ниже 16°C. Зимой температура падает ниже нуля.

*Таблица 1. Основные характеристики климата в южной части Согдийской области (зона, в которую входит джамоат Чоркух)*

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-8°C и менее
	Максимум:	+31°C и более
	Среднее дневное значение:	+25°C и более в июле
	Среднегодовое значение:	+19-2° C
Относительная влажность	май - 73%, июль - 43%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	166мм	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 90 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° C	
Приземная температура	От 32°C до 35°C и может быть больше (июль)	
Высота (метров над уровнем моря):	868м	
Скорость ветра:	До 2 м/сек.	
Сейсмичность района	8 баллов	

В городе Исфары зима достаточно мягкая, при этом температура воздуха опускается до -4°C и ниже. Самый холодный месяц январь, со средней максимальной температурой 6°C и средней минимальной температурой -8°C. Самый теплый месяц июль, со средней максимальной температурой 31°C. Общее среднегодовое осадков составляет около 166мм. Самый сухой месяц в году август, когда выпадает в среднем 4мм осадков. Самый влажный месяц май, в котором выпадает в среднем 27мм осадков. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м2.

Реализуемый подпроект CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары» входит в зону 8-балльной сейсмичности, которая считается зоной повышенного риска землетрясений наибольшей интенсивности Республики Таджикистан.

Характеристика района строительства:

1. Климатический подрайон - (IVA);
2. Сейсмичность района строительства - (8 баллов);


3. Расчётная зимняя  $t^o$  наружного воздуха - (-13,5 °C);
4. Нормативная снеговая нагрузка - (70 кг/м<sup>2</sup>);
5. Нормативное ветровое давление - (38 кгс/м<sup>2</sup>)

**Физическое описание:** в рамках реализации подпроекта CSP-2B-33, на свободном участке средней школы №24 села Ходжай аъло было предусмотрено строительства нового детского сада мощностью для более 32 мест.



*Эскиз: Главный фасад детского сада*

Строительство здания детского сада в махалле Ходжай аъло, который был выбран в рамках подпроекта ППС, будет состоять из одноэтажного здания, в здании находятся 2 комнаты для групп детей 3-4 лет, 2 спальных комнат для 32 мест, кабинет директора, кабинет врача, столовая, прачечная, ванная комната, санузел для взрослых, санузел на 4 места.

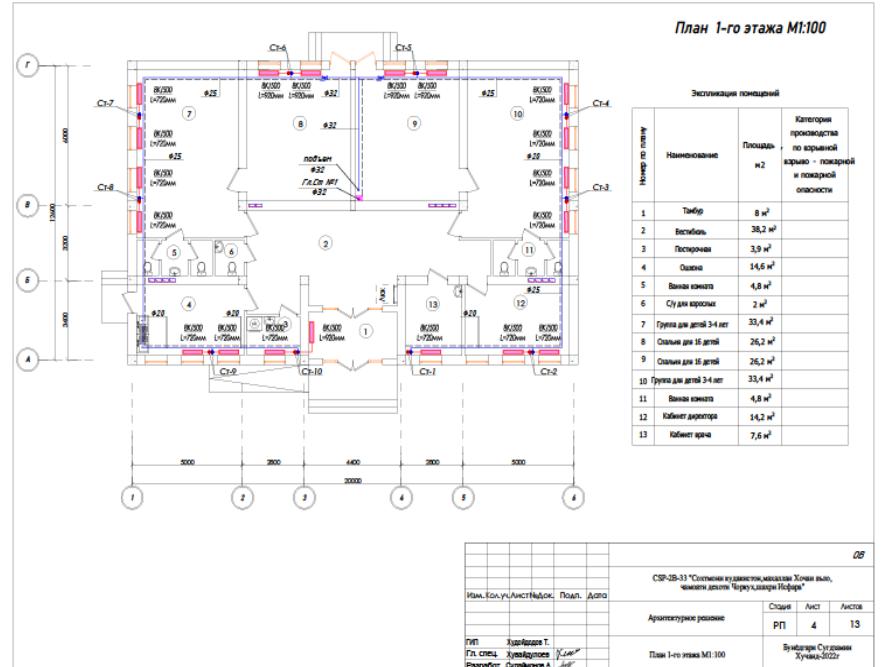

### План детского сада в махалле Ходжаса аъло

Технико-экономические показатели здания детского сада:

- ✓ Площадь застройки – 286,5 м<sup>2</sup>;
- ✓ Общая площадь – 239,3 м<sup>2</sup>;
- ✓ Полезная площадь – 217,3 м<sup>2</sup> ;
- ✓ Строительный объём – 875,2 м<sup>3</sup>.

Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями главы МКС РТ “Сейсмостойкость строительства. Нормы проектирования”. Монолитные железобетонный каркас и его элементы рассчитаны и законструированы с учётом воздействия горизонтальной сейсмической силы. Кирпичные стены усилены монолитными сердечниками и сварными сетками.

Конструктивные решения:

1. Фундаменты-монолитные, ленточные из бетона кл.В15
2. Стены-из кирпича М75 на растворе М50 толщ. В=400мм
3. Колоны монолитный железобетонный из бетона кл.В20
4. Ригель- монолитный железобетонный из бетона кл.В20
5. Перекрытия- многопустотные железобетонные плиты
6. Кровля- чердачная на деревянной конструкции, покрытия из крашенных металличерепиц.

В рамках реализации подпроекта CSP-2B-33 также было предусмотрено кроме строительство здания детского сада, установка системы видеонаблюдения, септик, кательная, хозсарай, резервуар, водонапорная башня 1м3, туалет на 6 очков, беседки, установка парковых скамеек, уличных урн, приобретение и установка пожарного щита, информационный щит и ящик для жалоб, благоустройство территории. В связи с

инфляцией и изменения цен на строительные материалы было принято решение сократить объём работ.

### **Техническое решение**

**Водоснабжение** – Источником водоснабжения данного объекта является существующая водопроводная сеть села. Внутренняя сеть водопровода монтируется из полипропиленовых труб с наружным диаметром 20 мм.

**Горячее водоснабжение** - для горячего водоснабжения детского сада используются электроводонагреватели. Для внутреннего горячего водоснабжения предусмотрено использования труб ПВХ D=20мм.

**Бытовая канализация** - Система бытовой канализации предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов в герметичный септик, из которого по мере накопления вывозятся на ближайшие очистные сооружения. Внутренняя сеть канализации монтируется из полиэтиленовых канализационных труб диаметрами 50-110 мм. Все санитарно-технические приборы снабжаются сифонами. Вытяжная часть канализационных стояков выводится выше кровли.

**Вентиляция** - в здании принята приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением.


**Пожарный водозабор** – в качестве мер пожарной безопасности предусмотрено установка пожарной сигнализации, резервуар объёмом 25м3. Резервуар наполняется дождевым и естественным путем, так как расположен ниже уровня трубопровода села.

Так же для пожарной безопасности предусмотрен пожарный щит. В стандартную комплектацию пожарного щита входит: Штыковая и совковая лопаты, противопожарный топор, конусное ведро, пожарный лом, багор, переносные огнетушители, ящик с песком

**Система отопления помещений** – для отопления помещений детского сада предусмотрено установка биметаллических радиаторов водяного отопления. Подача теплоносителя предусмотрено из котельной путём установки трубопровода из труб ПВХ d=25мм – d=60мм.

Котельное помещение будет расположаться с западной (задней) части основного здания на удалении около 20м. Длина трубы дымохода превышает высоту верхней кромки окна здания детского сада на 3,52м, что почти


полностью исключает попадания вредных выбросов котельной в помещение детского сада.

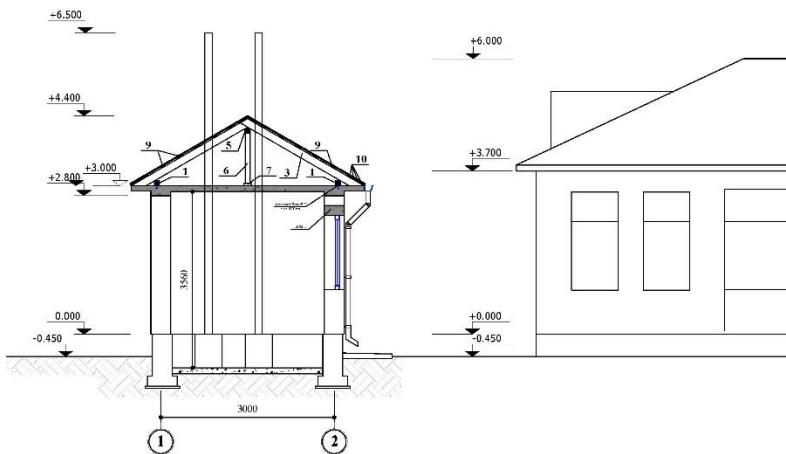

#### **Эскиз основного здания и котельная**

Основным направлением ветра в стране является восточный (23%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать северо-восточный (18%).

В котельное предусмотрено установка котла камбинированного нагрева (электронагрев, твёрдотопливный нагрев). Использования твёрдого топлива (угля или дров) будет осуществляться в случаях перебоев в подаче электроэнергии (ниже смотрите Генеральный план место строительства на территории школы села Ходжай айло).

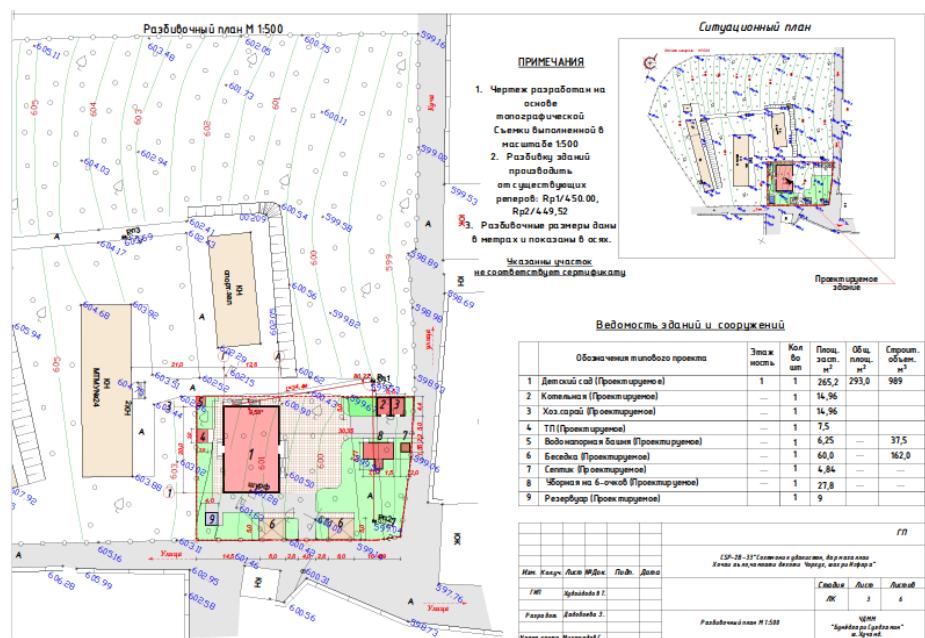

**Чертёж: Генеральный план (ГП).**

1. Детский сад (проектируемый)

2. Котельная (проектируемый)
3. Хозсарай (проектируемый)
4. Водонапорная башня (проектируемый)
5. Септик (проектируемый)

Продолжительность строительство по подпроекту CSP-2B-33 предусмотрено 12 месяцев. В зависимости от погодных условий может быть продлён по письменному согласованию с Всемирного Банка.

**Биологическое описание:** Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

**Геологическое описание:** Геология характеризуется сложенными кайнозойскими и преимущественно миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин. Почвы и горные породы не будут подвергаться воздействию при ремонтных работах.

**Гидрографическое описание:** Гидрографическое состояние района относится к бассейну реки Исфара.

Источником питания реки Исфара является ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды.

Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.

**Социально-экономическое описание:** город Исфара Согдийской области расположен в долине реки Исфара и граничит на востоке, запад и юг с Баткенской области Киргизии.

Центром города является Исфара, а также имеется 12 сельских джамоатов, в которые входят 54 сёл. Общее количество населения района составляет более 260,7 тысячи людей, из них 81% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, около 19% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.

	<p>Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p>
Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?	<p>Строительные материалы: цемент, жженый кирпич, пило/материалы, кровельные материалы, а также необходимые материалы будут доставлены из Б. Гафуровского района на расстояние 123 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект CSP-2B-33 будут поставляться поблизости от действующего карьера города Исфара.</p>

### **Законодательство**

Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности	<i>Перечень национальных законов и нормативов</i>	
	<i>Название правового документа</i>	<i>Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль над исполнением</i>
Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ	
Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ	
Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ	
Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ	
Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»	
Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ	

### *Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном*

*Таблица 2*

Базельская конвенция о контроле трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция об инспекции труда (2009)
Конвенция ООН о правах ребенка (1993)

### *Экологические и социальные требования ВБ:*

*Таблица 3*

ОП/БП 4.00	Пилотное применение национальной системы
------------	--

		Заёмщика для обеспечения экологической и социальной безопасности в проектах Всемирного банка
ОП/БП 4.01		Экологическая оценка
ОП/БП 4.12		Принудительное переселение
ОП/БП 7.50		Международные воды – как дополнительная
Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС): (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (б) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов;		

***Перечень строительных норм и правил  
Республики Таджикистан***

Таблица 4

СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»
СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

### **Публичные консультации**

Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации

Общественная консультация по подпроекту CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары» был проведен 24 июня 2022 года в махалле Ходжай аъло, на территории средней школы №24 со стороны специалистов центрального офиса НСИФТ. В консультации участвовали жители, и преподаватели данного села их количество составлял 12 человек из них 1 женщина. Относительно Плана социалльно-экологических мероприятий (ПСЭМ) для подпроекта CSP-2B-33 со стороны сообщества предложений и комментарии не поступило. Протокол, сертификат землепользователя, фото и список участников общественных консультаций прилагается в данном документе (Приложения).

### **Развитие институционального потенциала**

Ожидается ли развитие потенциала?

Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных

	<p>инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности». В рамках данной деятельности будет предусматриваться проведение адресной информационно-просветительской работы и подготовки в учебных лагерях (т.е. базовой краткосрочной подготовки) для уязвимых молодых мужчин и женщин, а также услуг по поддержке жизнедеятельности (т.е. обучение предпринимательскому мышлению, анализу местного рынка, основам бухгалтерского учета, поддержка в подготовке бизнес-планов, последующее наставничество и обучение методам включения деятельности по смягчению последствий изменения климата в деятельности по обеспечению средств к существованию). НСИФТ будет нести ответственность за проведение данного тренинга; Перспективной молодежи будут предоставлены инструменты и оборудование в натуральной форме для облегчения ее доступа к небольшому капиталу в натуральном виде.</p> <p>Программа обучения будет проводиться специалистами управления ООС района и специалистами НСИФТ.</p> <p>В Общественных консультациях будут участвовать руководители джамоата, директор школы, учителя и активные жители села.</p>																				
Информация о повышении потенциала (тренингах)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тематика тренинга(модуль)</th><th>Кто проводит</th><th>Для кого проводит</th><th>Ожидаемые результаты</th><th>Сроки (примерно)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Меры безопасности</td><td>ПОС</td><td>ПКД, ПКС, предст-ли общ.</td><td>Осведомлён-сть и участие сообщ</td><td>До начала строительства</td></tr> <tr> <td>2.Эксплуатация и техническое обслуживание</td><td>ПОС</td><td>ПКД, ПКС, предст-ли общ.</td><td>Осведомлён-сть и участие сообщ</td><td>До начала стр. и на этапе строит.</td></tr> <tr> <td>3.Вопросы по эк.соц. безопасности</td><td>Специалист НСИФТ</td><td>ПКД, ПКС, предст-ли общ.</td><td>Осведомлён-сть и участие сообщ</td><td>До начала стр. и на этапе строит.</td></tr> </tbody> </table> <p>Примечание: ПОС-Партнёры по обучению и содействию. (Бюджет-Оплата по контракту) Специалист НСИФТ (Бюджет-оклад по контракту)</p>	Тематика тренинга(модуль)	Кто проводит	Для кого проводит	Ожидаемые результаты	Сроки (примерно)	1.Меры безопасности	ПОС	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала строительства	2.Эксплуатация и техническое обслуживание	ПОС	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала стр. и на этапе строит.	3.Вопросы по эк.соц. безопасности	Специалист НСИФТ	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала стр. и на этапе строит.
Тематика тренинга(модуль)	Кто проводит	Для кого проводит	Ожидаемые результаты	Сроки (примерно)																	
1.Меры безопасности	ПОС	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала строительства																	
2.Эксплуатация и техническое обслуживание	ПОС	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала стр. и на этапе строит.																	
3.Вопросы по эк.соц. безопасности	Специалист НСИФТ	ПКД, ПКС, предст-ли общ.	Осведомлён-сть и участие сообщ	До начала стр. и на этапе строит.																	
Какие политики ВБ применимы к проекту/подпроекту?	<p>К проекту поддержки сообщества применимы следующие политики всемирного банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OP 4.01 Экологическая оценка – в качестве основной</li> <li>• OP 7.50 Международные воды – как дополнительная.</li> <li>• OP 4.12 Принудительное переселение</li> </ul>																				

	<p>Непосредственно к подпроекту CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай аъло, джамоата Чоркух, города Исфары»:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• OP 4.01 Экологическая оценка – в качестве основной</li></ul>
--	---

## ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
	Деятельность/вопрос	Статус	Инициируемые действия
<b>A</b>	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий	Нет	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий не планируется
	<b>Строительство новых небольших объектов</b>	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в <b>Разделе А ниже</b>
<b>B</b>	<b>Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта</b>	Да	Отвод сточных вод в рамках реализации подпроекта <b>CSP-2B-33</b> является централизованный в <b>Разделе В ниже</b>
<b>C</b>	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
<b>D</b>	<b>Отвод земельных участков</b>	Да	Отвод земель в рамках реализации подпроекта <b>CSP-2B-33</b> предусмотрен в <b>Разделе D ниже</b>
<b>E</b>	Опасные или токсичные материалы	Нет	Подрядчику при необходимости следовать мерам, описанным в <b>Разделе E ниже</b>
<b>F</b>	<b>Безопасность движения транспорта и пешеходов</b>	Да	Строительные работы будут проводиться на выделенном свободном участке СШ№24 CSP-2B-33 что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов в <b>Разделе F ниже</b> .
<b>G</b>	<b>Управление социальными рисками</b>	Да	Подрядчику необходимо следовать <b>Разделу G ниже</b>

## ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах и разместить их в местах проведения работ.	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ).	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ.	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ.	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или, при невозможности полного недопущения - сведение к	НСИФТ

	минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду.	
	Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочих нормам передовой международной практики (использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви).	Подрядная организация
	Подрядчику необходимо перед началом работ обустроить места для приёма пищи, отдыха и для общих санитарно-гигиенических нужд (раздевалка, туалет, душевая).	Подрядная организация
	Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать.	Подрядная организация
	Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья.	Подрядная организация
	Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры, направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ.	Подрядная организация
	Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ	Подрядная организация

		Согласно ГНиП РТ 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве».	
		Подписание кодекса поведения работников подрядных организаций	Подрядная организация
		Создание системы управления дорожным движением и проведение обучения персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта.	Подрядная организация
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота.	Подрядная организация
<b>А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы</b>	Качество воздуха	Летний период в городе Исфара длительный и жаркий, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что при строительстве детского сада, может негативно влияться на качестве атмосферного воздуха и здоровье населения. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия: -запрещается сбрасывать строительные отходы через	Подрядная организация

	<p>оконные проемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сжигать строительные отходы и другой мусор; - готовить еду на открытом огне;</li> <li>-подметать территорию и внутренние помещения строящего объекта с предварительным увлажнением поверхностей;</li> <li>-накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления;</li> <li>-накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли;</li> <li>-при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидр подавлению пыли (поливанием водой);</li> <li>-необходимо устанавливать пылеулавливающие экраны на участке проведения работ, связанных с интенсивным образованием пыли;</li> <li>-строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке;</li> <li>-при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов вместе их временного хранения для предотвращения пылеобразования;</li> <li>-не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений.</li> <li>-не допускать сжигание на участке работ сухостоя,</li> </ul>	
--	---	--

		опавших листьев.	
	Фауна и флора	<p>В ходе реализации проекта, вырубка или пересадка деревьев предусмотрено, подрядной организации необходимо учитывать то что, при вырубки или пересадки деревьев подрядная организация в первую очередь должен уведомить специалиста эколога района. Эколог должен составлять соответствующий акт и фиксировать весь процесс, от вырубки до посадки деревьев. Подрядная организация несет ответственность за халатное отношение. Предоставить копию составленного акта главному специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>По политике ВБ и экологическим стандартам РТ если дерево будет вырублено, то подрядная организация обязан посадить соответствующего дерево по соотношению один к трем и ухаживать за посаженным деревьями в течение одного года.</p> <p>Согласно действующей политике ВБ и экологическим стандартам РТ детские сады и образовательные учреждения должны иметь благоустроенную территорию и выраженную зеленую зону.</p> <p>Цель благоустройства территории школы – это создание безопасного, комфортного пространства, в котором дети проводят свободное время. Озеленение участка помогает создать благоприятную образовательную среду в детском</p>	Подрядная организация

		<p>саде и школе. Высокие деревья дают тень, защищают детей от перегрева в жаркий сезон. Озелененные территории снижают уровень шума, насыщают воздух кислородом и влагой. Устойчивая экосистема на территории учебного заведения создает благоприятный для здоровья людей климат.</p>	
	Шум	<p>Ожидается незначительное повышение уровня шума при строительстве, транспортировке материалов, эксплуатации строительной техники, в частности, при раскопках, пневматическом бурении, работе строительных кранов, разгрузке инертных материалов необходимых для строительства (щебень, песок), досок и металла, а также погрузки строительных отходов. В этой связи повышенный шум при строительстве может принести неудобства жителям прилегающих домохозяйств. Поэтому необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время с 9:00 до 17:00.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из оконных проемов для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p> <p>Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его</p>	Подрядная организация Стройинспекция

		эксплуатации с Правительством района, так как объект находится в райцентре не далеко от административного здания органа исполнительной власти района.	
	Качество воды	<p>В территории строительной площадки находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычна система (лотки для отвода ливневых вод), а также система водоснабжения источником является централизовано. Система арычного полива заполняется водой в сезон дождей и не только. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, рекомендуется размещение площадки для временного хранения строительных отходов обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время строительных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории стройплощадке. Чистка автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории стройплощадке заправка ГСМ, замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения</p>	Подрядная организация Стройинспекция

	<p>загрязнения поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо сбрить и хранить в специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов первого этажа и выше для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и, как следствие, загрязнения почв.</p>	
Управление отходами	<p>Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать там, где будет безопасно и удобно для погрузки и вывоза их за территорию.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения неопасных строительных отходов необходимо согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части).</p> <p>Все строительные отходы, которые образовались в</p>	Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ

ходе работ (металлические элементы, древесина, бумага и картон, провода) подрядчику необходимо складировать отдельно друг от друга для дальнейшей переработки или использования.

Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенном месте. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга. Строительные отходы должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.

Исключать во время строительства образование опасных жидкых строительных отходов, которые при попадании в систему канализации могут привести к ее засору, поломке, химическому изменению бытовых сточных вод, которые приведут к нарушению работы городских очистных сооружений.

Неопасные строительные жидкие отходы необходимо удалять в систему городской канализации. При этом, надо иметь в виду, что остатки бетонных растворов, которые не были использованы, нельзя сливать в городскую систему канализации. Их необходимо законсервировать и использовать позже, если это невозможно, то надо

		дать им застыть и размещать вместе с другими неопасными твердыми строительными отходами. На территории реализации подпроекта CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай альо, джамоата Чоркух, города Исфары», канализация отсутствует.	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	Сточные воды (ливневая вода, вода, используемая для мытья рук, полов и пр.) от строительной площадки, отводятся после отчистки в арычную систему.	
С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай альо, джамоата Чоркух, города Исфары», не является «Культурным наследием».	
Д. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	Реализация подпроекта CSP-2B-33 «Строительство детского сада в махалле Ходжай альо, джамоата Чоркух, города Исфары» будет производиться на отведенном свободном участке СШ№24. Школа имеет сертификат землепользователя, в связи с этим (приобретение земли не предусмотрено).	

Е. Токсичные материалы	Обращение с другими токсичными / опасными отходами	<p>Токсичных/опасных материалов на территории школы не имеется.</p> <p>При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы, то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Уведомить руководство школы, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека.</li> <li>-Аккуратно, не повреждая оболочку прибора, переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.</li> <li>-Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими</li> </ul>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>знаками.</p> <p>-Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами.</p> <p>При обнаружении поврежденных отходов, содержащих ртуть</p> <p>-Вызвать территориальное подразделение МЧС.</p>	
	Прямые или косвенные опасности	<p>Строительные работы будут проводиться в пределах территории школы. Территория проведения работ огорожена, и доступ транспорта и людей ограничен, что не влияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.</p> <p>Возведение и строительство, особенно на участке новой застройки, может потребовать проезда тяжелой техники, перевозка материалов на стройплощадку и со стройплощадки может увеличить зашумление и пробки на дорогах. Для идентификации риска обычно проводят исследование организации дорожного движения, например, близость дорог к школам, и меры снижения негативного воздействия, например, ограничение движения в определенные часы, в начале и в конце школьного дня. Другие меры безопасности могут включать ограничение скорости, организацию зон парковки, пешеходные переходы и так далее.</p>	
F. Безопасность	Управление	Подрядчик назначает одного своего сотрудника в	Подрядная организация

дорожного движения и пешеходов	связями с общественностью	<p>качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения. Ящик для жалоб и предложений будет находиться на информационном стенде находящейся в Джамоате. Подрядчик будет еженедельно контролировать ящик с жалобами и предложениями, и предпринимать меры по урегулированию жалоб. Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p> <p>Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ.</p> <p>Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них.</p> <p>Во всех семинарах сообщество было проинформировано о механизме подачи предложений и жалоб. Жалобы можно подать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямым обращениям к сотрудникам регионального и головного офиса НСИФТ.</li> <li>• Написав письмо и сбросив в почтовый ящик, находящийся на информационном стенде Джамоата.</li> <li>• Отправить на электронную почту НСИФТ: <a href="mailto:info_csp@nsift.tj">info_csp@nsift.tj</a>.</li> </ul>	НСИФТ
--------------------------------	---------------------------	--	-------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53 (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться);</li> <li>• Координатору проекта ППС НСИФТ: Маруфу Нажмиддинову. тел: +992-988-62-26-00.</li> <li>• Главному специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности Насирджанову Фарходу. тел: +992-985-98-85-88.</li> <li>• Менеджеру представительства НСИФТ в городе Исфара: Ниёзматов Сайдмухаммад, тел.: +992-927-80-29-05.</li> <li>• Координатору по мобилизации сообщества НСИФТ в городе Исфара: Ишанова Махина, тел: +992-927-52-60-08.</li> </ul>	
G. Управление социальным риском	Управление трудовыми вопросами	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и связи с этим должны соблюдаться следующее требования:</p> <p>-Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён;</p> <p>-Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено;</p> <p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и обязанности с соблюдениями трудовых норм, то есть</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 часовой рабочий день, в случае превышения</li> </ul>	Подрядная организация НСИФТ

	<p>установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 часовая рабочая неделя;</li> <li>• 1 час на обед;</li> </ul> <p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и должен строго следовать ему, вплоть до увольнения рабочих и взимания соразмерных финансовых штрафов: образец кодекса поведения будет вставлен в <i>(Приложение)</i>.</p> <p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах управления связями с местным населением:</p> <p>-Организовать доступ рабочих к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>-Разработать систему рассмотрения жалоб от рабочих.</p> <p><u>Условия проживания</u>; с учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечения их адекватными</p>
--	--

	<p>условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спальными комнатами с кроватями;</li> <li>• Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты;</li> <li>• Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду);</li> <li>• В холодное время года – электрообогревателем;</li> </ul>	
Требования к охране здоровья и безопасности работников	<p><u>Охрана здоровья:</u> - На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму.</p> <p>-Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке.</p> <p>-Проведения регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19;</p> <p><u>Безопасность работников:</u> - Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности.</p>	Подрядчик

		<p>-Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами;</p> <p>-Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.).</p>	
--	--	---	--

## ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
------------------	---------------------------------------	---	---	---	--	--

### ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Огражденный земельный участок школы	Наличие сертификата на землю требованиям ОПП	На местах, где расположен земельный участок	Визуальное наблюдение земельного участка путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом, проверка сертификата землепользователя.	До начала проектирования	Предотвращение недобровольного приобретения земли и во избежание переселения	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию
Составления технического задания на	Сбор исходных данных для составления технического	На местах и в офисе	Верификация документов	До начала проектирования	Обеспечить технический порядок	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному

проектирование	задания				при проектирования	развитию
Разработка ПСД (Проектно-сметной документации)	Соответствия ПСД согласно техническим заданиям  Включение экологических требований в проектную документацию и ВОР (ведомость объем работ)	На местах и в офисе	Верификация документов	Регулярно в период разработке ПСД	Для качественной разработки ПСД и соблюдения технического задания	Правительства района-отдел архитектуры и землепользования
Проведения экологической экспертизы	Соответствия подпроекта к экологическим требованиям по охране окружающей среды	В офисе	Верификация документов	1 раз	Для соблюдения требования по охране окружающей среды	НСИФТ – Региональный офис
Проведения Государственной экспертизы	Соответствия ПСД Государственным требованиям	За рабочим столом (в офисе) и при необходимости на местах	Верификация документов	1 раз	Для соответствия ПСД Государственным требованиям	Проектная организация
Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
Информированность близлежащего сообщества	информирование общественности о проведении работ посредством встречи с общественностью и (или) размещения объявлений в местах общего доступа.	В ближайших джамоатах и домохозяйств	Наблюдение, проверка установленных вывесок, протоколов общественных собраний, опрос населения или домохозяйств,	1 раз до начала работ	Обеспечение информированности населения	НСИФТ – Региональный офис
Наличие механизма жалоб	Наличие КРЖ (комитет по рассмотрению жалоб)	В джамоате	Проверка документов о формировании	1 раз до начала работ	Обеспечение функционирования механизма	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному

			комитета по рассмотрению жалоб, Наличие информационных табло с указанием контактов членов данного комитета		рассмотрения жалоб	развитию
Включение требований ПУОСС в контрактную документацию	Включены ли требования, изложенные в ПУОСС в контрактную документацию, в проектную документацию	В офисах и на объекте строительства	Изучения контракта и других документов, проектной документации	На этапе проектирование и заключения контракта, на начальном этапе, в процессе строительства и завершения работ	В целях обеспечения требованиям ВБ, нормативных актов и законов РТ	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию

#### ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	Специалисты НСИФТ по закупкам, по охране окружающей среды и по техническому надзору;
Перевозка строительных материалов и отходов  Передвижение строительной техники	Техническое состояние транспортных средств и оборудования; - Защита грузовых автомобилей при помощи чехла; - Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	- Строительная площадка; - Маршруты транспортировки строительных материалов и отходов	Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра	1 раз до начала работ	Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнение атм. воздуха, повышенной концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

					кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума	
Движение строительной техники	Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	На маршруте	Обследование маршрута	На постоянной основе Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время	Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора наикратчайшей дороги до места назначения, снижения риска автомобильных аварий.	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Техническое обслуживание строительной техники	Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Во время эксплуатации автотехники и оборудования	Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ Своевременно локализовать и уменьшить ожидающий ущерб в случае пожара Снижение шума при ремонте техники	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды (СпоООС); НСИФТ - Специалист по техническому надзору (СпоТН); НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта. (СпоМОП)
Посадка (Пересадка) деревьев взамен вырубленных. Ограждение деревьев от внешнего механического воздействия (строймусора)	Наличие АКТа о вырубке деревьев и соответствующих документов. Фото момента вырубки, посадки и посаженных деревьев в соотношении три к одному (Полив и	Участок выполнения работ, при благоустройстве территории строящегося объекта	Визуальное наблюдение путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	В период выполнения работ	Для соблюдения требований по охране окружающей среды Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья и	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды (СпоООС); НСИФТ - Специалист по техническому надзору (СпоТН); НСИФТ - Специалист по мониторингу и

находящихся в непосредственной близости от строящегося объекта	ухаживание в течении 12 месяцев). Фото огражденных деревьев от внешнего механического воздействия(строймусра)				негативного влияния на сообщество.	оценке проекта. (СпоМОП)
Образование строительных отходов	Временное хранение строительных отходов в специально отведенных местах. Сортировка и отдельное хранение опасных отходов от неопасных	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод Сокращение объемов опасных отходов Увеличение объемов перерабатываемых отходов	-Администрация СШ№70 НСИФТ -; СпООС НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
	Своевременное удаление отходов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбросанных фрагментов строительных материалов и мусора Сохранять эстетичный вид строительной площадки и ее окрестностей. Защита почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха при временном хранении отходов	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	-Администрация СШ НСИФТ - СООС; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и

	предприятием					оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ. Защита окружающей среды	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение правил эксплуатации строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения; Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасности труда	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей, снижение риска заражения COVID	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.
Здоровье и безопасность сообщества	Организация безопасности при проведении работ по периметру объекта, прилегающих территорий, наличие необходимых ограждений, знаков и информационных стендов Уведомление общественности о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или)	Участок выполнения работ, подъездные пути до строительной площадки, близлежащие домохозяйства	Визуальное наблюдение путём проведения скрининга, консультации с окружающим сообществом	До начала проектирования и в период выполнения работ	Для соблюдения требования по охране окружающей среды Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья и негативного влияния на сообщество.	-Администрация СШ НСИФТ -; Способствование НСИФТ - Специалист по техническому надзору; Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора;

	размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ), и прилегающих территориях					
Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Не применение детского труда Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	-Администрация СШ НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Связь с общественностью	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС, Прямыми обращениями к сотрудникам регионального и головного офиса НСИФТ. Написав письмо и сбросив в почтовый ящик находящееся на информационном стенде Джамоата. Отправить на электронную почту НСИФТ: <a href="mailto:info_csp@nsift.tj">info_csp@nsift.tj</a> Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе:+992-2-21-87-53 (звонок	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС

			<p>можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться); Главному специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности Насирджанову Фарходу. тел:+992-985-98-85-88.</p> <p>Менеджеру представительства НСИФТ в городе Исфара: Ниёзматову Сайдмухаммад, тел.:+992-927-80-29-05.</p> <p>Координатору по мобилизации сообщества НСИФТ в городе Исфара: Ишановой Махине, тел:+992-927-52-26-08.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

#### ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для	Помещения школы и детского сада технологии	Осмотр помещений СШ№24 и	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в СШ№24 и в детском	-Администрация СИИ Государственный Центр санитарного
-------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------	--	--

	бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории СШ№24 и детского сада на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов		детского сада; Проверка наличия и действительности договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием		саде; Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	эпидемиологического надзора;
Благоустройство	Ухаживание и полив деревьев и растительности	Территория школы и детского сада	Визуальное наблюдение	Общий срок эксплуатации объекта	Для соблюдения требования по охране окружающей среды Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья и негативного влияния на сообщество.	-Администрация СШ
Водоснабжение и канализация	Качество монтажа трубопроводов, состояние подключенных сантехнических оборудования и стойки, работоспособность по предназначению	Помещения школы и учебного корпуса по технологии	Визуальное наблюдение	Общий срок эксплуатации объекта	Чтобы избегать проблем связанных с некачественным монтажом которые приводят к затоплениям и порче имущества Соответствовал проектной документации и нормативным требованиям	-Администрация СIII
Готовность к чрезвычайным ситуациям	Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных	Помещения школы и детского сада по технологии	Периодические проверки	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риски для детей, школьников и персонала СШ№24 и детского сада;	-Администрация СIII ответственный по ГО и ЧС;

	резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС				Избегать сбоев в предоставлении коммунальных услуг в СШ№24 и детского сада.	
--	--	--	--	--	---	--

Составил:

Главный специалист Алматов Алишер

## Приложения

1. Подтверждающий документ – Решения правительства города Исфара.



Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд  
Раиси шаҳри Исфара  
**ҚАРОР**

аз «10» 01 соли 2022 №32 шаҳри Исфара

Дар бораи тасдиқи санади комиссияи мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Исфара «Дар бораи лоиҳагирӣ ва соҳтмони «Кӯдакистон барои 120 чой» дар деҳаи Хоҷаи Аълои Ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ

Мутобиқи моддаҳои 19 ва 20-и Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ», моддаҳои 7, 11, 26 ва 30-и Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси мактуби БМИМ ҷТ шаҳри Исфара аз 14.12.2021, №11, ҚАРОР МЕКУНАМ:

1. Санади замимагардидаи комиссияи мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Исфара «Дар бораи лоиҳагирӣ ва соҳтмони «Кӯдакистон барои 120 чой» дар МТМУ №24-и деҳаи Хоҷаи Аълои Ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ аз 10.01.2022, №03, тасдиқ карда шавад.

2. Ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №24-и деҳаи Хоҷаи Аълои Ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ барои лоиҳагирӣ ва соҳтмони «Кӯдакистон барои 120 чой» аз ҳисоби қитъаи замини зери соҳтмони МТМУ №24-и деҳаи Хоҷаи Аълои Ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, тибқи тартиби муқарраргардида иҷозат дода шавад.

3. Ҳангоми лоиҳакашӣ талаб ва шартҳои идораҳои даҳлдор ҳатман ба инобат гирифта шавад.

4. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳр - мутасаддии соҳаҳои саноат, меъморӣ ва шаҳрсозӣ вогузор карда шавад.

Раиси шаҳр



Баҳоваддин Баҳодурзода



## 2. Письмо Зав.ГОРОНО

Данъарзода Му  
Бобоев Н.И.  
Мухаммаджонов М.  
Барон Кадибеков  
2.12.2021



Журнал № 3  
Барон Кадибеков  
(н.п.№600)

Чумхурии Тоҷикистон вилояти Суғд,  
макомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Исфара  
раёсати маориф  
735920, шаҳри Исфара, кӯчаи Ҷомӣ №5, тел: 2-37-51

№ 1040<sup>а</sup> аз 9 ноября соли 2021

Ба раиси шаҳри Исфара  
мухтарам Баҳодурзода Б.Б.

Раёсати маорифи макомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Исфара ба  
маълумоти Шумо мерасонад, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №64-и  
чамоати дехоти Чоркух дар минтақаи сарҳади байни Ҷумхурии Тоҷикистон ва  
Ҷумхурии Қирғизистон ҷойгир буда, соли 2001 бо тарики ҳашар аз тарафи  
падару модарон барои 140 чойи нишаст соҳта шуда, дар биноми 228 нафар  
аз он 110 нафар дуҳтарон хонандагон дар ду баст таҳсил намуда истодаанд.

Тибки лоҳаи КАССА-1000 ташкилоти Бунёди миллии иҷтимоии  
маблағузории Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки дар муассиса барои беҳтар  
намудани сатҳу сифати таълим бинои дуошёна барои 240 чойи нишаст ибораи  
аз синҳона, ҳуҷра кории директор, хонаи омӯзгорон, анбори ангтишт ва ҳавзи  
об барои сӯҳорхомӯшкунӣ бунёд намояд ва ҳамзамон дар ҳудуди бинои кӯхнаи  
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №24 боғчай бачагона барои 120 нафар  
кӯдакон бунёд намояд.

Аз ин лиҳоз аз Шумо эҳтиромона ҳоҳиш карда мешавад, ки барои  
гирифтани иҷозатнома аз ташкилотҳои МНДЭС, кумитаи идораи замини шаҳри  
Исфара, шабакаи барқ, таъминоти оби нӯшоқӣ, ҳадамоти оташнишонии шаҳр  
оид ба иҷрои лоҳаи мазкур мусоидат намоед.

Сардори раёсати маориф

*Лубо*

Б.Сайдзода.

Ба Ҳаронӣ ӯ.  
Бобуров С.  
Разабов Ӣ.  
Муҳаммадзуддӯзе Ӣ. С.  
Бобоев Ӣ.  
Барон Ҳорроев Ӣ.  
Суҳебзода Ӣ.

Барон Ҳорроев Ӣ.

Барон Ҳорроев Ӣ.	Боридот: 7/3046
12-11-2021	
Кумитаи идораи замини шаҳри Исфара	
Воридот № 393	
26.11.2021	

### 3. Министерства образования



Чумхурии Тоҷикистон вилояти Суғд,  
мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Исфара  
раёсати маориф  
735920, шаҳри Исфара, кӯчаи Ҷомӣ №5, тел: 2-37-51

№1124 аз 2 декабри соли 2021

Ба директори иҷроияи Бунёди  
Миллӣ-иҷтимоии маблағузории  
Тоҷикистон  
муҳтарам Сиддикзода Ш.М.

Раёсати маорифи шаҳри Исфара аз ташабbusи пешгирифтai  
Бунёди Миллӣ-иҷтимоии маблағузории Тоҷикистон ҷиҳати  
амалисозии лоиҳаи “Соҳтмони бинои кудакистони дехаи Ҳочаи Аъло,  
ҷамоати дəҳоти Чоркуҳи шаҳри Исфара”, ки дар доираи “CASSA-1000  
Лоҳаи дастгирии чомеа” татбиқ мешавад, миннатдорӣ баён менамояд.

МО баҳри амали гардонидани лоиҳаи мазкур ҳаматарафа мусоидат  
намуда, кӯмаки амалии худро мерасонем.

Сардори раёсати маориф

Б.Сайдзода.



#### 4. Контрольный перечень предварительной социальной проверки.

##### **РЎЙХАТИ НАЗОРАТИ ПЕШАКИ САНЦИДАШУДАИ ХИФЗИ ИЧТИМОИ (ОМЎЗИШ)**

Номи лоиҳа: Зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, маҳаллаи Xочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара».

Рӯз/вакти сафар: 24.06.2022 Ноҳия/шаҳр Исфара

Иштирокчиён:

Сармутахассис оид ба ҷораҳои экологӣ-ичтимоӣ; Носирҷонов Фарҳод

Сармутахассис оид ба маниторинг ва аразёбӣ: Муҳиддинов Максуд

Менечери намояндагии БМИМТ дар шаҳри Исфара: Ниёзматов Сайдмуҳаммад

Ҳамоҳангсози минтақави оид ба рушди ҷомеаи намояндагии БМИМТ дар шаҳри Исфара:  
Ишанова Маҳина

№	Фаъолият	Ҳа	Не	Эзоҳҳо
1	Ҳариди замин, биноҳо (истикоматӣ ва тиҷоратӣ)		Не	Сертификати ҳукуки истифодаи замин №A 0291655 дар асоси қарори Раиси шаҳри Исфара аз 20.09.2010, № 443 қитъаи замин, умумӣ 3,30 га, (раками бакайдгирӣ №1273 аз 02.09.2011), Қитъаи замини 1; барои муассисаи таҳсилоти миёнаи ҷумумии №24
2	Ҳариди тиҷорат ё тавсса, ки ҳангоми вайронкунихо / кӯҷидани манзилҳо, иҷорагирон, доронҳои корбарони гайрирасмӣ амалӣ карда мешаванд		Не	Қитъаи заминни барои соҳтмон ҳоли мебошад
3	Ҳариди замин, ки боиси аз даст рафтани доронҳои ашҳоси алоҳида ё ҷомеа / гурӯҳҳои мушаҳҳас, алаҳусус ақаллиятҳои этнӣ мегардад: Захираҳои табӣ <input type="checkbox"/> Муҳити зисти анъанавӣ <input type="checkbox"/> Фаъолиятҳои анъанавӣ <input type="checkbox"/> Иншооти коммуналӣ		Не	Истифодабарии қитъаи замин боиси аз даст рафтани доронҳои ашҳоси алоҳида ё ҷомеа ва захираҳои табӣ, аз он чула, муҳити зисти анъанавӣ, фаъолиятҳои анъанавӣ, иншооти коммуналӣ намешавад.
4	Ҳариди / ё тавссеаи тиҷорате, ки метавонад ҳафро зиёд ва афзоиш дигар: 1. Вайрон кардани кодекси меҳнати конунҳо, аз ҷумла истифодаи меҳнати кӯдакон 2 Таъқиби гурӯҳҳои ақаллиятҳои қавмӣ дар ин минтақаи лоиҳа (марбут ба шаҳсият, шаъну зътибор ва шароити зиндагии онҳо дар системаи таъминоти ҳаёт, ҳувияти фарҳангӣ) 3. Қочоқи одамон		Не	Дар соҳтмон меҳнати кӯдакони то 18-сола истифода намешавд, ҷонки конун иҷозат намедигард аз ҷумла Конвенсияҳо: <ul style="list-style-type: none"><li>• Шаклҳои бадтарин дар бораи меҳнати кӯдакон (2005);</li><li>• Конвенсияи бекоркунни меҳнати мачбурий (1999);</li></ul>
5	Оё ҳариди замин бо истифода аз конунни ҳукуки давлат ба амволи сурат мегирад?		Не	Дар сурати зарурати ҳариди замин тибқи мукаррароти конун амали карда мешавад.
6	Бинобар ҳариди замин манзил ва заминҳои истикоматӣ талафоти доимӣ ё мувакқатӣ ҳоҳад дошт?		Не	Ҳариди замин аз шаҳрвандон ба накша гирифта нашудааст.
7	Бинобар азҳудкунни замин талафоти доимӣ ё мувакқатии доронҳои қишоварзӣ ва дигар моликияти истехсолӣ буҷуд дорад?		Не	Талафоти моддӣ ба назар гирифта нашудааст, ҷонки ба заминҳои қишоварзи ва хусуси дастраси надоранд.
8	Талафот дар зироатҳо, дараҳтон ва		Не	Талафот аз хисоби маҳсулотҳои

	<b>воситаҳои асосӣ аз ҳисоби азхудкунни заминҳо ҳоҳад буд?</b>		кишоварзи намешавад, чунки ба заминҳои кишоварзӣ таъсир расонила намешавад.
9	Оё талафоти доимӣ ё мувакқатии тичорат вучӯд дорад	Не	Дар замини чудогашта ягон шахс тичорат ташкил накардааст.
10	Оё бинобар ҳариди замин манбаҳои даромад ва воситаҳои зиндагӣ доимӣ ё мувакқатӣ гум мешаванд?	Не	Агар замин аз шаҳрвандон ҳаридори гардад манъбаҳои даромад гум мешавад.
11	Агар замин ё моликиятии хусусӣ тавассути принципи ҳаридори манфиатдор ва фурӯшандай манфиатдор ба даст оварда шавад, оё ин ба қӯҷонидани доимӣ ё мувакқатӣ ё қӯҷилани сокинон оварда мерасонад?	Не	Дар сурати даҳолати миёнаравҳо ба қучонидани маҷбури оварда мерасонад.
12	Агар замин ё моликиятии хусусӣ тавассути гуфтушунид ё тавассути принципи ҳаридори манфиатдор ва фурӯшандай манфиатдор ба даст оварда шавад, ин ба қӯҷонидани доимӣ ё мувакқатӣ ё ҷойивазкунни истифодабарандагони гайрирасмии замин (шахсони бидуни ҳуқуки қонунӣ ба замин) ё ашхосе, ки ҳудсарона азхудкунни замин, оварда мерасонад?	Не	Замин бо таври гайрирасмӣ аз истифодабаранда зуран гирифта намешавад, агар ин замин гасбшуда ё мувакқатан истифодашаванда бошад. Ин яке аз талаботҳои асосии Бонкӣ Үмумиҷаҳонӣ мебошад.
13	Оё доиҳа ягон маҳлудияти доимӣ ё мувакқатӣ оид ба истифодай замин ё дастрасӣ ба боғҳо ё минтакаҳои муҳофизатшавандаро дар бар мегирад ва ба ин васила мардум ё ягон ҷомеаро маҷбур мекунад. ки дастрасӣ ба сарватҳои табии, манзилҳои анъанавӣ, заминҳои коммуналӣ ё объектҳоро аз даст дихад?	Не	Лоиҳа бинобар доштани шаҳодатномаи истифодай ҳуқуки замин ба минтакаҳои муҳофизатшавандаро маҳлуд накарда, ба сарватҳои табии, манзилҳои анъанавӣ, заминҳои коммуналӣ монеа эҷод намекунанд.
14	Оё лоиҳа аз заминни давлат ё дигар замин ё амволи давлат, ки қӯҷонидани доимӣ ё мувакқатии сокинони гайрирасмӣ ё корбарони гайрирасми (манзилий ё иқтисодӣ)-ро талаб мекунад?	Не	Заминни истифодашаванда моликияти давлатӣ буда, давлат кафолати истифодай оқилона ба манфиати шаҳрвандонро медиҳад.
15	Оё ягон минтақаи фарҳангӣ дар наздикий мавҷуд аст ё агар посухи шумо ҳа бошад, аз ҷойҳои бостоншиносӣ ҳориҷ кунед, ки метавонанд ба маблағгузорӣ аз ҷониби доиҳа таъсир расонанд?	Не	Айни замон, минтақаи фарҳангӣ дар наздикии иншооти соҳташаванда вучӯд надоранд.

Намояндагони БМИМТ:

1. Носирҷонов Фарҳод
2. Муҳиддинов Максуд
3. Ниёзматов Сайдмуҳаммад

Намояндагони ҷамоат ва деҳа:

1. Рустамов Олим.
2. Ҷӯраев Розимҷон.
3. Ҷӯраев Немат.

□

**«CASA-1000 ЛОИХАЙ ДАСТГИРИИ ЧОМЕА» (ППС)  
«CASA 1000 COMMUNITY SUPPORT PROJECT» (CSP)**

Номи зерлоиха: Зерлоихай CSP-2B-33 «Сохтмони кўдакистон, маҳаллаи Хочаи аъло, чамоати деҳоти Чоркӯҳ, шаҳри Исфара».

Рӯз/вакти сафар: 24.06.2022 Нохия/шахр \_\_\_\_\_ шаҳри\_Исфара\_\_\_\_\_

Иштирокчиён: Носирҷонов Фарҳод мутахассиси хифзи мухити зист ва ҷораҳон иҷтимоӣ, ва дигарон\_\_\_\_\_

**1. Фаъолиятҳои кунунӣ ва таърихи минтақаи чудогашта.**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Дар маҳал бо ки тамос гирифтани мумкин аст, (ном, унвон, маълумот барои тамос)?	<i>Шарипов Рӯбодуллоҳи тег: 918.77.78.93 (МРЧ)</i>
2	Барои фаъолияти лоиҳа чӣ қадар майдони замин истифода мешавад?	<i>410 ил., Ҳуджумон, Қатъон, санҷак, ҷонғодидон</i>
3	Айни замон минтақа чӣ гуна истифода мешавад?	<i>Ҳуджумон</i>
4	Ин минтақа дар гузашта чӣ гуна истифода мешуд (агар имконпазир бошад, санаҳоро пешниҳод кунед)?	<i>Замини ҳаддозӣ фӯми</i>

**2. Вазни экологӣ**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё дар наздикии минтақаи лоиҳа ягон объекти маҳсус вучуд дорад (мамнӯъгоҳ, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои таъриҳӣ)?	<i>Ҳесӣ</i>
2	Оё дар минтақа обанборҳо мавҷуд аст?	<i>Ҳесӣ</i>
3	Релеф замин чи гуна мебошад?	<i>Ҳамзабор</i>
4	Оё каблан дар ин мавзеъ обхезӣ ва ярҷу рӯҳ дода буд?	<i>Ҳесӣ</i>
5	Оё нишонаҳои эрозия вучуд доранд?	<i>Ҳесӣ</i>
6	Кадом биноҳо (масалан, мактабҳо, биноҳои истиқоматӣ, иншооти саноатӣ) ва истифодай замин наздиканд? Масофаро таҳмин кунед.	<i>Голове барҷ. № ГИУН-24-16 хонаи санҷу - 15 са</i>
7	Оё минтақаи пешниҳодшуда ба наклиёт ё хидматрасонии коммуналӣ таъсир мерасонад?	<i>Таъсир на се-срёдениҳо</i>

**3. Литсензияҳо, иҷозатномаҳо ва барасмиятдарорӣ**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё минтақа барои фаъолияти пешниҳодшуда литсензия ё иҷозатнома талаб мекунад? Оё онҳо барои тафтиш дастрасанд?	<i>Сертификати санҷо-заршини ҳарҷи, дарборас аси.</i>
2	Кадом мақомоти хифзи мухити зист ё дигар (масалан, тандурустӣ, хоҷагии чангал) дар ин минтақа салоҳият доранд?	<i>Беҳремони иҷроӣ зисти ҳ. Шефиро</i>

**4. Саволҳо дар бораи сифати об**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Новобаста аз он ки фаъолияти пешбинишуда обро бо ягон максад истифода мебарад (тағсилот дигед ва микдорро хисоб кунед). Манбаи об чист?	<i>Ҳамисаби мазди мӯяни</i>
2	Оё дар натиҷаи фаъолияти пешниҳодшуда оби партов вучуд дорад? (Микдорро таҳмин кунед ва ҷои партофтани оби партовро муайян кунед)	<i>Оби партов ҳесам.</i>

**«CASA-1000 ЛОИХАИ ДАСТГИРИИ ЧОМЕА» (ППС)  
«CASA 1000 COMMUNITY SUPPORT PROJECT» (CSP)**

3	Оё системай обгузар барои обҳои рӯизамиинӣ ва канализатсия вучуд дорад?	<i>Ҳесӣ</i>
4	Оё накшা барои системаҳои мавҷудаи тозакунии заҳкашӣ ё партовҳо вучуд дорад?	<i>Ҳесӣ</i>

**5. Ҳок**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Сатҳи замин чӣ гуна аст (замини кишоварзӣ, ҷароғоҳ ва д.).	<i>Заминни кишоварзӣ ҳамон</i>
2	Оё лоиҳа ҳангоми соҳтмон ё кор ба ҳок зарар мерасонад?	<i>Ҳашеррасод</i>
3	Оё лоиҳа ба ландшафт таъсири назаррас мерасонад (хушконидани ботлокзорҳо, тагирёбии маҷрои дарёҳо).	<i>Ҳашеррасодӣ.</i>

**6. Муҳити биологӣ**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Растаниҳои ин мавзеъро тасвир кунед.	<i>А дар ҷаҳоне мавзеъҳои</i>
2	Оё маълумот дар бораи олами наботот ва ҳайвоноти нодир ё дар зери хатар қарордошта вучуд дорад ё онҳо дар наздикии макон ҳастанд? Агар ин тавр бошад, оё лоиҳа таъсир ҳоҳад дошт ё ҳавфро зиёд мекунад?	<i>Ҳесӣ</i>
3	Рӯйхати ҳайвонот ва растаниҳои дар минтақа пахншударо гиред (агар бошад).	<i>Ҳесӣ</i>
4	Дар сурати татбики минбаъдаи лоиҳа ба таъсири эҳтимолии манғӣ ба муҳити биологӣ диккат дихед.	<i>— — —</i>

**7. Тартиботи санҷиши визуалӣ**

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Кӯшиш кунед, ки ҳаритаи минтақаро дастрас кунед ё эскизе тартиб дода, тафсилотро қайд кунед.	<i>Ҳархонаи ҳасен</i>
2	Агар иҷозат дода шавад, аксбардорӣ кунед.	<i>Акс ҳасен</i>
3	Барои муайян кардани фабъолиятҳо, ба қадри имкон дар атроф, аз ҷумла дар атрофи марзҳо сайр кунед.	<i>— — —</i>
4	Ба ҳама гуна бӯйҳо, дуд ё партоби визуалии губор, оби истода ва гайра диккат дихед.	<i>Бӯйҳо Ҳесӣ</i>

**Имзоҳо:**

Намояндагони БМИМТ:

1. *Қасирчонов Ф*
2. *Демиров А*
3. \_\_\_\_\_

Намояндагони ҷамоат ва деха:

1. *Рустамов Амиқ*
2. *Суроев Роміков*
3. *Чурнаев Чемал*

## 5. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды.

### Замимаи 5. Натиҷаҳои санчиши пешакии муҳити зист ва иҷтимоӣ

	Омода кард: Сармутахассиси чораҳои экологӣ-иҷтимоӣ намояндагни БМИМТ дар шаҳри Душанбе
	Ном ва имзо: Носирҷонов Фарҳод
	Вазифа: Сармутахассис оид ба чораҳои бехатарии экологӣ-иҷтимоии БМИМТ.
	Рӯз: 24.06.2022
<input type="checkbox"/> Категориии хавф: "Баланд". Таъсири назаррас, аз маблағгузорӣ хориҷ карда шавад	Тасдиқ шудааст: Тахияи хучҷати Арзёбии таъсири экологӣ ва иҷтимоӣ (АТЭИ)
<input type="checkbox"/> Категориии хавф: "Муҳим". Таъсири маҳдуд ё мувакқатӣ	Ном ва имзо: Носирҷонов Фарҳод
<input type="checkbox"/> Категориии хавф: "Мӯътадил". Таъсири маҳдуд ё мувакқатӣ	
<input type="checkbox"/> Категориии хавф: "Паст". Таъсири надорад	

Пас аз таҳлили чек-листҳо маълум гардид, ки зерлоиха: CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Xочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара», ки фаъолиятҳоеро, ки дар замимаи 1 номбар шудаанд, дар бар намегиранд ва хавфҳои назарраси экологӣ надорад.

Ба зерлоихан пешниҳодгашта: CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Xочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара», хучҷати Арзёбии таъсири экологӣ ва иҷтимоӣ (АТЭИ) таҳия намуда ба лоиҳакашини корҳои соҳтмонӣ идома дода шавад.

## 6. Сертификат землепользователя

Замин дар Чумхурин Төмөнкостон молиңкити пешенди  
даиваги бууда, давлат пистифодан самараңыз опро ба мәннәти  
халықтардан таңылған.

### Заминистифодабарандыгын хүкүктөрдөрдү:

мүсаккаполадар жамин хошандырды памозыл;  
мөнлини кийнүү маңында кийнөвдөрдүн кийнөвдөрдүн  
форурнан боланды;

бөлдөрнөктердөн таңылған Коекес заминин Чумхурин  
Төмөнкостон майзин пистифодоистекстөй, мөлдөнүү маний вай  
дигар түштүкпөтөрдө бүлэг памозыл.

### Заминистифодабарандыгын үздөлдердү:

заминдо мұнайфын македең ва шартход мұайяннанда  
пистифода берилді;

заминни дөлделүларо самараңыз пистифодада барылда да аз  
технологияны барон жағын габантың пешининдең пешеселдіг  
пистифодада памула, ба байдулдаш вагын әкөнгөн махалдер  
паратап фарыннан жоңғаңдарын розындашылдык  
сары нақтаподоз заңордулуп замин про суоранды,

хүкүкпін дингар заминистифодабарандыгынан таңылған  
нақунаны;

ба макомоти дахлидори хөкимияти махалдан сары вайғ  
мельзумотын сүйнүүн пистифодадан замини, киң мұнайфын  
коюн узорын Чумхурин Төмөнкостон мұкаррар тараудааст,  
пешинход памозыл.

(Аз Коекес заминин Чумхурин Төмөнкостон)

Дарачан А № 0291655

Сертификати хүкүки пистифодадан заминдо ба пешинодан

**БЕМІНДЕРДАТ БА МАКЕП ОБЫ ТОЖСИ-**

**РОТОМ АЛЫСАРЫ БАЛЫКАЛАМЫ НӨ 24**

Макомоти заминагин заминсозин Чумхурин Төмөнкостон дар

асоси карори **РӨЧСИ Ш. ҚСФОРА**  
аң "20" сә 20 10 № 443 дар он хүсүс төрдө, ки өн

Заминистифодабарандыгын македең замини **3.30** гектар  
аң оң

жардамдашылғанда заминин таңылған заминистифодабарын вебетта  
карада шуд.

Замин барын **АЛЫСАРЫЛГЫЗ**  
(безадыланы)

Сертификати македең ба заминистифодабарында ошпорида  
шуда дар күмтеги заминсозин похия (шахр) дар кигеби  
байкайтын хүкүки пистифодадан замин таңын тақын **1/1/2**  
аң "2" 646747/4 с.20 17 ба кайын тириғта шуд.

Макомоти  
давлаттын заминсозин  
Чумхурин Төмөнкостон




(2)

(1)

**НАКШАЙ**


Күнтөйн 1  
Зийнинстилификации  
Мөктөөбүг төхөсчилоты

МЧС'НАН ҮКҮҮЛҮҮНИ СҮГ 24

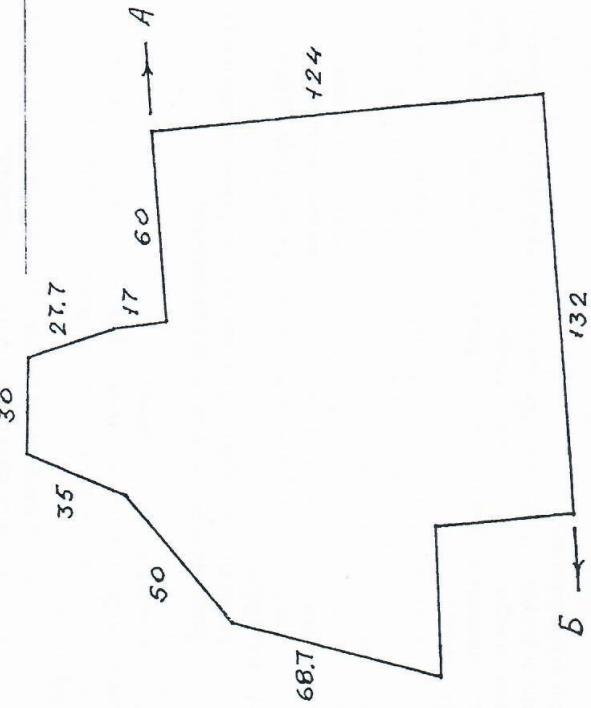

№ 1: 2000

Күнтөйн 2

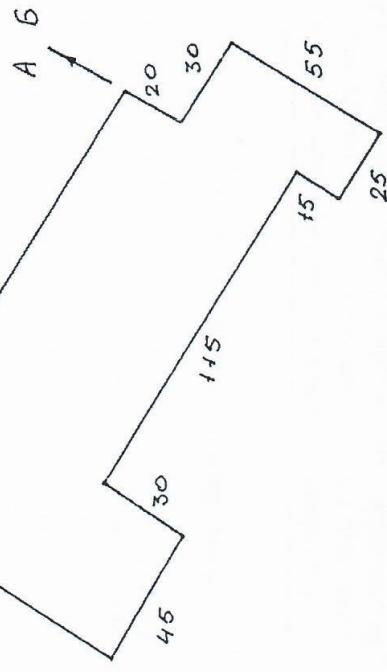

A

B

ТАВСИФИ ХУДУДУУДО;

Күнтөйн 1

Аз А то Б заминхой төмөрдөлийн охирчилсан  
Аз Б то В заминхой чистифорбон шаалбанд. Чотошт  
A3 Күнтөйн 2  
Аз А то Б замини чистигодан ашавхандай  
Ч. О. Чоркулбек

Күнгитэн заминсизин  
нохны (Ишар)



4)

3)

## 7. Протокол публичных консультаций.

«CASA-1000 ЛОИХАЙ ДАСТГИРИИ ЧОМЕА» (ППС)  
«CASA 1000 COMMUNITY SUPPORT PROJECT» (CSP)

### ПРОТОКОЛИ

Семинар-машварат оид ба мухокимаи хуччати «Нақшай идоракунни чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Хочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара».

Санаи баргузорӣ: «\_24\_» 06 соли 2022

Ҷой баргузорӣ машварат: маҳаллаи Хочаи аъло, МТМУ №24

**Мақсад:** Шиносой намудани чомеа ва ҷонибҳои ҳавасманд бо хуччати «Нақшай идоракунни чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» барои зерлоиҳаи CSP-2B-33 дар доираи татбиқи «CASA-1000 Лоиҳаи дастгирии чомеа».

**Иштирок намуданд:** Кормандони Идораи марказӣ ва Кормандони Намояндагии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон дар шаҳри Исфара:

- Носирҷонов Фарҳод – Сармухассис оид ба чораҳои экологӣ-иҷтимоӣ;
- Алматов Алишер – Сармухассис оид ба ҳудидоракунни маҳаллӣ;
- Ниёзматов Сайдмуҳаммад – менеджери намояндагии БМИМТ дар ш.Исфара:

#### Рӯзномаи семинар-машварат:

1. Маълумоти умуми дар бораи «CASA-1000 Лоиҳаи дастгирии чомеа»;
2. Маълумот дар бораи зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Хочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара»;
3. Муаррифӣ ва баррасии хуччати «Нақшай идоракунни чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи CSP-2B-33;
4. Таҳдилу музокираҳо нисбати хуччати НИЧЭИ ва ҷамъбасти натиҷаҳои семинар-машварат;

Семинар-машваратро бо сӯҳанҳои муқаддимавӣ Алматов Алишер, сармухассис оид ба ҳудидоракунни маҳаллӣ, идораи марказии БМИМТ дар шаҳри Душанбе кушоданд. Номбурда ҳозиринро бо рӯзномаи семинар-машварат шинос намуда, иброз дошт, ки дар ин ҷамъомад хуччати «Нақшай идоракунни чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои амалисозии зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Хочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара» мавриди баррасӣ қарор гардида, фикру мулоҳизаҳои иштирокчиён доир ба ин хуччати мазкур зарур мебошад.

Сипас, оид ба масъалаи якуми рӯзномаи машварат оид ба «CASA-1000 Лоиҳаи дастгирии чомеа» (ЛДЧ) Алматов Алишер, сармухассис оид ба ҳудидоракунни маҳаллӣ, идораи марказии БМИМТ дар шаҳри Душанбе ба иштирокчиёни семинар-машварат маълумоти умумӣ расонида, дар хотима такроран қайд намуд, ки мақсади асосии «CASA-1000 Лоиҳаи дастгирии чомеа» баланд бардоштани сифат ва тавссеи дастрасӣ ба хизматрасониҳои таъминоти неруи барқ, инфрасоҳтори иҷтимоию иқтисодӣ ва мусоидат намудан ба таҳқими иқтидори ҳудидоракунни маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои фарогири лоиҳа мебошад.

Менеджери намояндагии БМИМТ дар ш.Исфара, Ниёзматов Сайдмуҳаммад ба иштирокчиёни машварат наслабати рӯзномаи дуюми семинар-машварат оид ба таҳияи зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Хочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара» ва татбиқи он маълумоти муфассалро пешкаш намуд.

**«CASA-1000 ЛОИҲАИ ДАСТИРИИ ҶОМЕА» (ПСС)  
«CASA 1000 COMMUNITY SUPPORT PROJECT» (CSP)**

Рузномаи сеюми семинар-машварат, ки мақсади асосии гузаронидани чорабинии мазкур ба хотири баррасӣ намудани ҳуҷҷати таҳиягардида оид ба «Нақшан идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи CSP-2B-33 мебошад, ки муаррифии онро сармухахассис оид ба чораҳои экологӣ иҷтимоӣ, Носирҷонов Фарҳод дар сатҳи касби гузаронида, тавассути слайдҳо тамоми ҷузъиёти ҳуҷҷати мазкурро бо чораҳои пешниҳодшаванд ҷиҷати пешгирий ва паст намудани таъсири манғии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ ва иҷтимоиро қадам ба қадам ба иштирокчиёни машварат манзур намуд. Ин чунин қайд намуд, рафти корҳои соҳтмонӣ оид ба соҳтмони зерлоиҳаи CSP-2B-33 метавонад боиси таъсироти экологӣ марбут ба садо, ҷанг, ҳаво ва об, идоракунии партовҳои саҳт, таназзули гуногунии биологӣ, бехатарӣ ва саломатӣ шаванд, ки таҳияи ин ҳуҷҷати мазкур пешгирии ин падидаҳо мебошад. Дар баробари ин ҳар як шаҳрванд метавонад дар доираи амалишавии на танҳо зерлоиҳаи CSP-2B-33, балки дар татбиқи «CASA-1000 Лоиҳаи дасттирии ҷомеа» (ЛДЧ) пешниҳод барои беҳтар намудани раванди татбиқ ё барои арзу шикоят ба БМИМТ ва Бонки Умумиҷаҳонӣ муроҷиат намояд. Барои ин масъала механизми бозгашти алоқа ва телефонҳои хатҳои гарм вучуд дорад. Ҳаммаи амалҳои пешбинигардидаи ҳуҷҷати НИЧЭИ доираи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо тартибу низомномаҳо ва стандартҳои иҷимоӣ ва экологии Бонки Умумиҷаҳонӣ таҳия гардидааст, дар охири баромадаш гуфт Носирҷонов Фарҳод.

Сипас дар охири ҷамбости семинар-машварат тақроран аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон тақлифу пешниҳодҳо барои ворид намудан ба ҳуҷҷати «Нақшан идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» барои татбиқи зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, махаллаи Ҳочаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи, шаҳри Исфара» доранд ё не, аммо аз тарафи онҳо тақлиф ва пешниҳод карда нашуд.

Бо ҳамин семинар-машварат доир ба ҳуҷҷати НИЧЭИ барои амалишавии зерлоиҳаи CSP-2B-33 ба итмом расид ва намояндағони БМИМТ ба иштирокчиён чорабинии мазкур изҳори миннадори баён намуданд.

Протоколро навишт: Носирҷонов Фарҳод

24.06.2022.

8. Фото публичных консультаций в СШ№24 махалла Ходжай аъло.



## 9. Список участников публичных консультаций.

«CASA-1000 ЛОИХАИ ДАСТГИРИИ ЧОМЕА» (ППС)  
 «CASA 1000 COMMUNITY SUPPORT PROJECT» (CSP)

### Семинар – машварат

**Мавзӯи:** Мухокимаи хуччати «Накшай идоракуни чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи CSP-2B-33 «Соҳтмони кӯдакистон, маҷаллаи Ноҳаи аъло, ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ, шаҳри Исфара».

Шаҳр/нохия: \_\_шахри Исфара\_\_

Сана: “24” 06 2022

Ҷойи баргузорӣ: МТМЧ 24.

### Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаоб	Вазифа/ташкилот	Телефон	Имзо
1.	Шарипов Ӣ			
2.	Ҷӯшидов Ҷ			
3.	Чӯраев Нодураин	Соҳибкор. Ҳ.Ҕ	918-45-10-11	
4.	Хайдаров Сайфурроҳ	МТМЧУ 24	918-72-78-9	
5.	Чӯраев Насимат	Соҳибкор	985136856	
6.	Дустамов Омилҷӯҷ	Муов. раис. КЛД	918851760	
7.	Сафарзоб Ҷ	Соҳибкор	989086482	
8.	Хайдаров Насруроҳ	Устон соҳиб. Қизловон	989089838550	
9.	Маликов Ҳасанбек	Соҳибкор		
10.	Маликова Шарифа	Директори сийёҳи 24		
11.	Ҷӯшидов Ҷӯҳ	Аъзми КЛД	918524001	
12.	Бобохонов Ҷӯҳ	МТ - 24		5.20
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Шахси масъул: \_\_ Носирҷонов Фарҳод \_\_

Имзо: \_\_\_\_\_

## 10. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ (ОБРАЗЕЦ)

### 1. Общие положения

1.1 Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работник/консультант Проекта независимо от занимаемой ими должности.

Каждый работник/консультант Проекта независимо от занимаемой ими должности должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, и каждый работник/консультант в отношениях с ним вправе ожидать от других сотрудников поведения в соответствии с положениями Кодекса.

Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

Кодекс является руководством к действию при возникновении конфликта личных интересов и интересов работодателя, а также в других ситуациях этического выбора. От работников/консультантов требуется подтвердить свою осведомленность о требованиях Кодекса и важности сообщений о нарушениях. Каждый работник/консультант несет личную ответственность за исполнение Кодекса.

- 2 1.5. По любым вопросам, касающимся исполнения Кодекса, можно обратиться к своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу.
- 3 1.6. Работодатель защищает конфиденциальность информации и права работников/консультантов в случаях обращения с добросовестными жалобами на нарушение Кодекса.
- 4 1.7 Особая ответственность за соблюдение Кодекса лежит на руководящем составе. Каждый руководитель подразделения обязан личным примером поощрять этичное поведение и соблюдение закона, формировать культуру безопасности, заниматься профилактикой и принимать оперативные меры для устранения нарушений Кодекса, учитывать соблюдение требований Кодекса при проведении оценки персонала.
- 5 1.8 Любое юридическое или физическое лицо, которое оказывает услуги или выступает от её лица, должно быть информировано о Кодексе. Организация требует от деловых партнеров безусловного уважения и соблюдения этических принципов, касающихся обеспечения безопасности, предотвращения коррупции.
- 6 1.9. Для организации информирования работников и работы с обращениями назначается должностное лицо. Исполнение Кодекса контролируется Исполнительным директором.

### 208. ОБЯЗАННОСТИ. ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ

Быть честными и открытыми.

Своевременно и честно сообщать о допущенной ошибке.

Строго соблюдать служебную и коммерческую тайну, не допускать ситуаций, когда ссылки на необходимость защиты информации прикрывают неэффективность или низкое качество работы.

Обеспечивать полное, точное и согласованное представление позиции при взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, поставщиками и подрядчиками работ и услуг, общественными организациями и средствами массовой информации.

Не брать и не давать взяток в любой форме, не попустительствовать взяточничеству, вымогательству и хищению в рамках реализуемых проектов, и имущества находящегося в собственности.

**Исключить сексуальное домогательство используя служебное положение .**

Исключить возможность использования служебного положения для личной или групповой выгоды, а также в целях недобросовестной конкуренции.

Осуществлять деятельность, связанную с закупками в строгом соответствии с законодательством и максимальной выгодой для реализуемых проектов.

Выявлять неэффективные процессы и управленческие процедуры, добиваться их изменения к лучшему.

Эффективно делегировать полномочия, обеспечивая необходимый баланс ответственности и ресурсов для выполнения порученного дела.

Соблюдать правила делового общения, быть пунктуальными и безупречно вежливыми с коллегами, деловыми партнерами, представителями средств массовой информации и другими заинтересованными сторонами.

Не создавать условия для получения надлежащей выгоды, пользуясь своим служебным положением.

Соблюдать установленные правила предоставления информации.

Сообщить непосредственному руководителю или руководству о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Вести себя достойно, действовать в строгом соответствии со своими трудовыми обязанностями, принципами и нормами профессиональной этики;

Избегать ситуаций, провоцирующих причинение вреда деловой репутации и авторитету Проекта.

## **218. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА/КОНСУЛЬТАНТА**

Работник/консультант, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблением и клевете, направленным на дискредитирование его деятельности и деятельности Проекта.

Зашита работника/консультанта от противоправных действий дискредитирующего характера является моральным долгом руководства Проекта.

Руководителю Проекта надлежит поддерживать и защищать работника/консультанта в случае его необоснованного обвинения.

Руководителю Проекта надлежит поддерживать и защищать работника/консультанта в случае его необоснованного обвинения.

## **228. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ**

В служебном поведении работник/консультант воздерживается от:

Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

Работники/консультанты должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с коллегами и другими гражданами.

Внешний вид работника/консультанта при исполнении им трудовых обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен соответствовать общепринятым деловому стилю, который отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.

### **238. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ НСИФТ**

Работники НСИФТ за совершение правонарушений и норм, установленных в настоящем Кодексе поведения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

В соответствии со статьями 62, 42 Трудового кодекса Республики к дисциплинарным взысканиям относятся, в частности, замечание, выговор и увольнение работника. Согласно статье 62 Трудового кодекса республики трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в следующих случаях:

- ликвидация организации или увольнение работодателя - физическое лицо или сокращение численности или штата работников
- расторжение трудового договора в связи со сменой собственника, несоответствие работнику выявленной должности или выполненной работы из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующего продолжению этой работы, если это несоответствие работника подтверждено сертификацией или на основании медицинского заключения
- систематическое невыполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись дисциплинарные меры
- отсутствие на работе без уважительной причины, в том числе отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня
- неявка на работу более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности, не считая декретного отпуска, если законодательством Республики Таджикистан не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) для определенного заболевания
- появление на работе в нетрезвом состоянии, вызванное употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных или других опьяняющих веществ
- вступившие в законную силу решения уполномоченного государственного органа о совершении кражи имущества работником и другие действия, препятствующие продолжению работы
- работник совершает преступление коррупционного характера, что исключает на основании судебного акта возможность дальнейшей работы
- продолжение участия работника в забастовке после доведения до его сведения решения суда объявить забастовку незаконной или запретить забастовку
- нарушение трудовыми обязанностями руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем или руководителем подразделения работодателя, повлекшее причинение материального ущерба работодателю
- отказ от прохождения медицинского осмотра с целью установления факта опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотиков, психотропных или других опьяняющих веществ
- нарушение работником правил охраны труда, пожарной безопасности или безопасности движения, которые повлекли или могли повлечь серьезные последствия, в том числе травмы и несчастные случаи
- предоставление при приеме на работу недостоверной информации, поддельных документов и несоблюдение иных правил, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами

Республики Таджикистан.

- отрицательный результат работы в течение испытательного срока при приеме на работу.

Консультанты за совершение преступлений и нарушение норм поведения, установленных настоящим Кодексом, несут ответственность в соответствии с условиями Договоров между работодателем и работником, а также законодательством Республики Таджикистан.
